

# Hochbaumaßnahme Grundschule Reichenhain Sanierung Sporthalle



## Zeitleiste




## Finanzen

<b>Gesamtbudget*</b>	<b>1.540.000,00 €</b>
<b>Fördermittel</b>	<b>1.125.000,00 €</b>
<b>Stadt - Eigenanteil</b>	<b>415.000,00 €</b>
<b>*Vorsteuerabzugsberechtigt</b>	



<b>KG 200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>KG 300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>776.821,05 €</b>
<b>KG 400</b>	<b>Bauwerk - Techn. Anlagen</b>	<b>302.705,84 €</b>
<b>KG 500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>70.048,00 €</b>
<b>KG 700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>322.743,28 €</b>
<b>Summe Brutto</b>		<b>1.472.318,17 €</b>

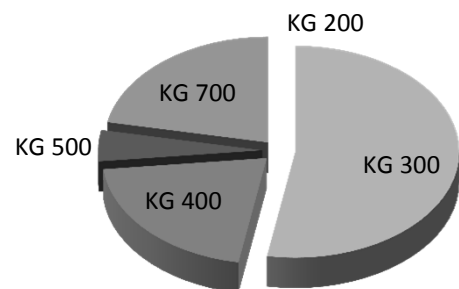

## Eckdaten

### eingeschaltete Architekten und Planungsbüros

Planung Bau	Delta-Plan
Planung Elektrik	Elektroplanungsbüro Künzel
Planung Heizung, Lüftung, Sanitär	Ingenieurbüro Jörg Grimm

### energetische Maßnahmen

Photovoltaikanlage auf dem Dach

