

Hochbaumaßnahme Sportforum Kleine Turnhalle Sanierung und Erweiterung



Zeitleiste




Finanzen

Gesamtbudget*	1.500.000,00 €
Fördermittel	900.000,00 €
Stadt - Eigenanteil	600.000,00 €
* Vorsteuerabzugsberechtigt	



KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	903.638,11 €
KG 400	Bauwerk - Techn. Anlagen	370.005,12 €
KG 700	Baunebenkosten	314.474,07 €
Summe Brutto		1.588.117,30 €

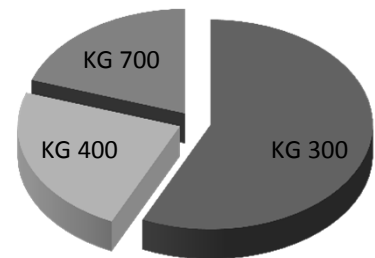

Eckdaten

eingeschaltete Architekten und Planungsbüros

Planung Bau	Planungsbüro Veit Bullmann
Planung Elektrik	Ingenieurbüro Goldammer
Planung Heizung, Lüftung, Sanitär	haustechnik ingenieurbüro eike krusche

energetische Maßnahmen

Fassaden- und Dachdämmung nach Vorgabe EnEV
Erneuerung Lüftungsanlage
Sonnenschutz an der Südseite

Lageplan

