**PROJEKTABLAUFPLAN** **Erneuerung Hirschstall mit Außengehegeanlage**

| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | **Erneuerung Hirschstall** | **458 Tage** | **Mon 27.01.14** | **Mit 28.10.15** |
| 3 | Einreichung Bauantrag | 65 Tage | Mon 27.01.14 | Fre 25.04.14 |
| 4 | Baubeschluss / Stadtrat | 1 Tag | Mit 30.04.14 | Mit 30.04.14 |
| 5 | Planung LPH 5 (Ausführungsplanung) | 41 Tage | Fre 02.05.14 | Fre 27.06.14 |
| 6 | Vorbereitung Vergabe | 23 Tage | Die 01.07.14 | Don 31.07.14 |
| 7 | Ausschreibung Bauleistungen | 66 Tage | Fre 01.08.14 | Fre 31.10.14 |
| 8 | Abschluss Bauverträge | 5 Tage | Mon 17.11.14 | Fre 21.11.14 |
| 9 | Umsetzung der Hirsche | 15 Tage | Mon 02.03.15 | Fre 20.03.15 |
| 10 | **Bauausführung** | **150 Tage** | **Mon 23.03.15** | **Fre 16.10.15** |
| 11 | Baubeginn | 1 Tag | Mon 23.03.15 | Mon 23.03.15 |
| 12 | Abbrucharbeiten | 15 Tage | Mon 23.03.15 | Fre 10.04.15 |
| 13 | Erdarbeiten | 10 Tage | Mon 13.04.15 | Fre 24.04.15 |
| 14 | Betonarbeiten | 15 Tage | Mon 27.04.15 | Fre 15.05.15 |
| 15 | Zimmererarbeiten (Fachwerkkonstruktion,Holzbekleidung) | 50 Tage | Mon 25.05.15 | Fre 31.07.15 |
| 16 | Dachdeckung/ Dachklempnerarbeiten | 14 Tage | Mon 03.08.15 | Don 20.08.15 |
| 17 | Heizung-, Sanitärinstallationen | 30 Tage | Mon 22.06.15 | Fre 31.07.15 |
| 18 | Elektroinstallationen | 30 Tage | Fre 19.06.15 | Don 30.07.15 |
| 19 | Zaunbau/ Außengehege | 30 Tage | Mon 24.08.15 | Fre 02.10.15 |
| 20 | Erdarbeiten Gehegeboden/Außengehege | 10 Tage | Mon 05.10.15 | Fre 16.10.15 |
| 21 | Kabelgraben, Versorgungsleitungen | 10 Tage | Mon 13.04.15 | Fre 24.04.15 |
| 22 | Zurückführung der Hirsche | 3 Tage | Mon 26.10.15 | Mit 28.10.15 |

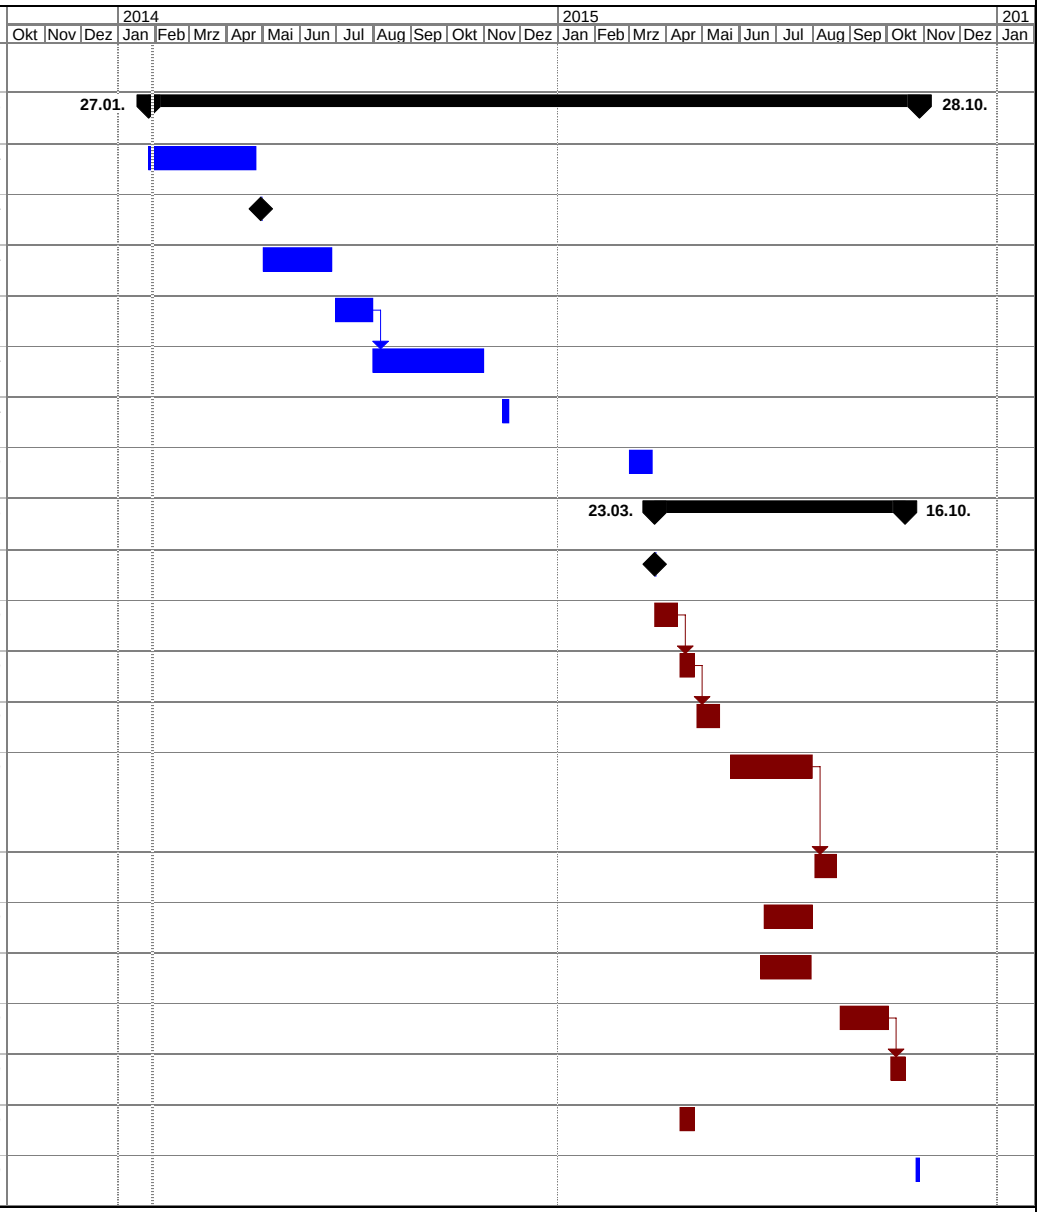


**Projekt:**
**Projektablaufplan_Hirschstall20.01.2014.m**
**Datum: 20.01.2014**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorgang | | Meilenstein | | Externe Vorgänge | |
| Unterbrechung | | Sammelvorgang | | Externer Meilenstein | |
| In Arbeit | | Projektsammelvorgang | | Stichtag | |
