Janusz_Korczak-Schule, VwV Investkraft - Budget "Bund", Komplettsanierung

Prognose Projektdurchlauf

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1				
2	Grundlagenentscheidung im Stadtrat	1 Tag	Mi 15.06.16	Mi 15.06.16
3	Planungsanlaufberatung	1 Tag	Mo 08.08.16	Mo 08.08.16
4	Auftaktberatung mit Schulleitung vor Ort	1 Tag	Fr 12.08.16	Fr 12.08.16
5	Einschaltantrag Architektenplanung	1 Tag	Fr 19.08.16	Fr 19.08.16
6	Auftrag an 17.31 zur Ausführung v. investiven leistungen	1 Tag	Mi 13.07.16	Mi 13.07.16
7	interne Raumvorstellung im GMH	1 Tag	Mi 31.08.16	Mi 31.08.16
8	interne Abgleich Raumkonzept mit SVA, Schule	1 Tag	Di 20.09.16	Di 20.09.16
9	Vorstellung Raumkonzept Schule / Hort	1 Tag	Fr 23.09.16	Fr 23.09.16
10	Abstimmung Raumkonzept mit Haustechnik	1 Tag	Fr 30.09.16	Fr 30.09.16
11	Verabschiedung Raumkonzept	1 Tag	Fr 30.09.16	Fr 30.09.16
12	**Vorplanung Lph. 2**	**55 Tage**	**Mi 31.08.16**	**Di 15.11.16**
13	Beantragung FM	1 Tag	Di 15.11.16	Di 15.11.16
14	**Entwurfsplanung Lph. 3**	107 Tage	Mi 16.11.16	Do 13.04.17
15	**Nachreichung Lph. 3 zum FMA**	1 Tag	Di 18.04.17	Di 18.04.17
16	**Zwischenschaltung VgV-Verfahren**	142 Tage	Fr 05.05.17	Mo 20.11.17
17	Präqualifikationsphase	87 Tage	Fr 05.05.17	Mo 04.09.17
18	Verhandlungsphase	34 Tage	Di 05.09.17	Fr 20.10.17
19	Zuschlagserteilung	21 Tage	Mo 23.10.17	Mo 20.11.17
20	Herbeiführung Bestätigung §12	20 Tage	Di 18.04.17	Mo 15.05.17
21	Zusammenstellung Unterlagen BAB im RIS	65 Tage	Di 18.04.17	Mo 17.07.17
22	Vorlagenerstellung im Session, Zustimmung	7 Tage	Di 18.07.17	Mi 26.07.17
23	Termindurchlauf Vorlage zum BAB	75 Tage	Do 27.07.17	Mi 08.11.17
24	DOB	1 Tag	Di 19.09.17	Di 19.09.17
25	PBUA	1 Tag	Di 17.10.17	Di 17.10.17
26	BAB im Stadtrat	1 Tag	Mi 08.11.17	Mi 08.11.17
27	**Genehmigungsplanung im Anschluss an VgV-Verfahren**	55 Tage	Mo 20.11.17	Fr 02.02.18
28	Bauantragsverfahren	70 Tage	Mo 05.02.18	Fr 11.05.18
29	Lph. 5 und 6	90 Tage	Mo 05.02.18	Fr 08.06.18
30	1. Ausschreibungszyklus	55 Tage	Mo 30.04.18	Fr 13.07.18
31	Prognose Bauzeit	430 Tage	Mo 22.10.18	Fr 12.06.20
32	Bauabschnitt 1	315 Tage	Mo 22.10.18	Fr 03.01.20
33	Bauabschnitt 2	95 Tage	Mo 06.01.20	Fr 15.05.20
34	Schlussabrechnung, Verwendungsnachweis	125 Tage	Mo 18.05.20	Fr 06.11.20
35	Inbetriebnahme	25 Tage	Mo 15.06.20	Fr 17.07.20
36	**Einzug (Sommerferien 2020)**	10 Tage	Mo 20.07.20	Fr 31.07.20
37				
38	Summe 2016	262 Tage	Fr 01.01.16	Sa 31.12.16
39	Summe 2017	262 Tage	So 01.01.17	So 31.12.17
40	Summe 2018	261 Tage	Mo 01.01.18	Mo 31.12.18
41	Summe 2019	261 Tage	Di 01.01.19	Di 31.12.19
42	Summe 2020	262 Tage	Mi 01.01.20	Do 31.12.20

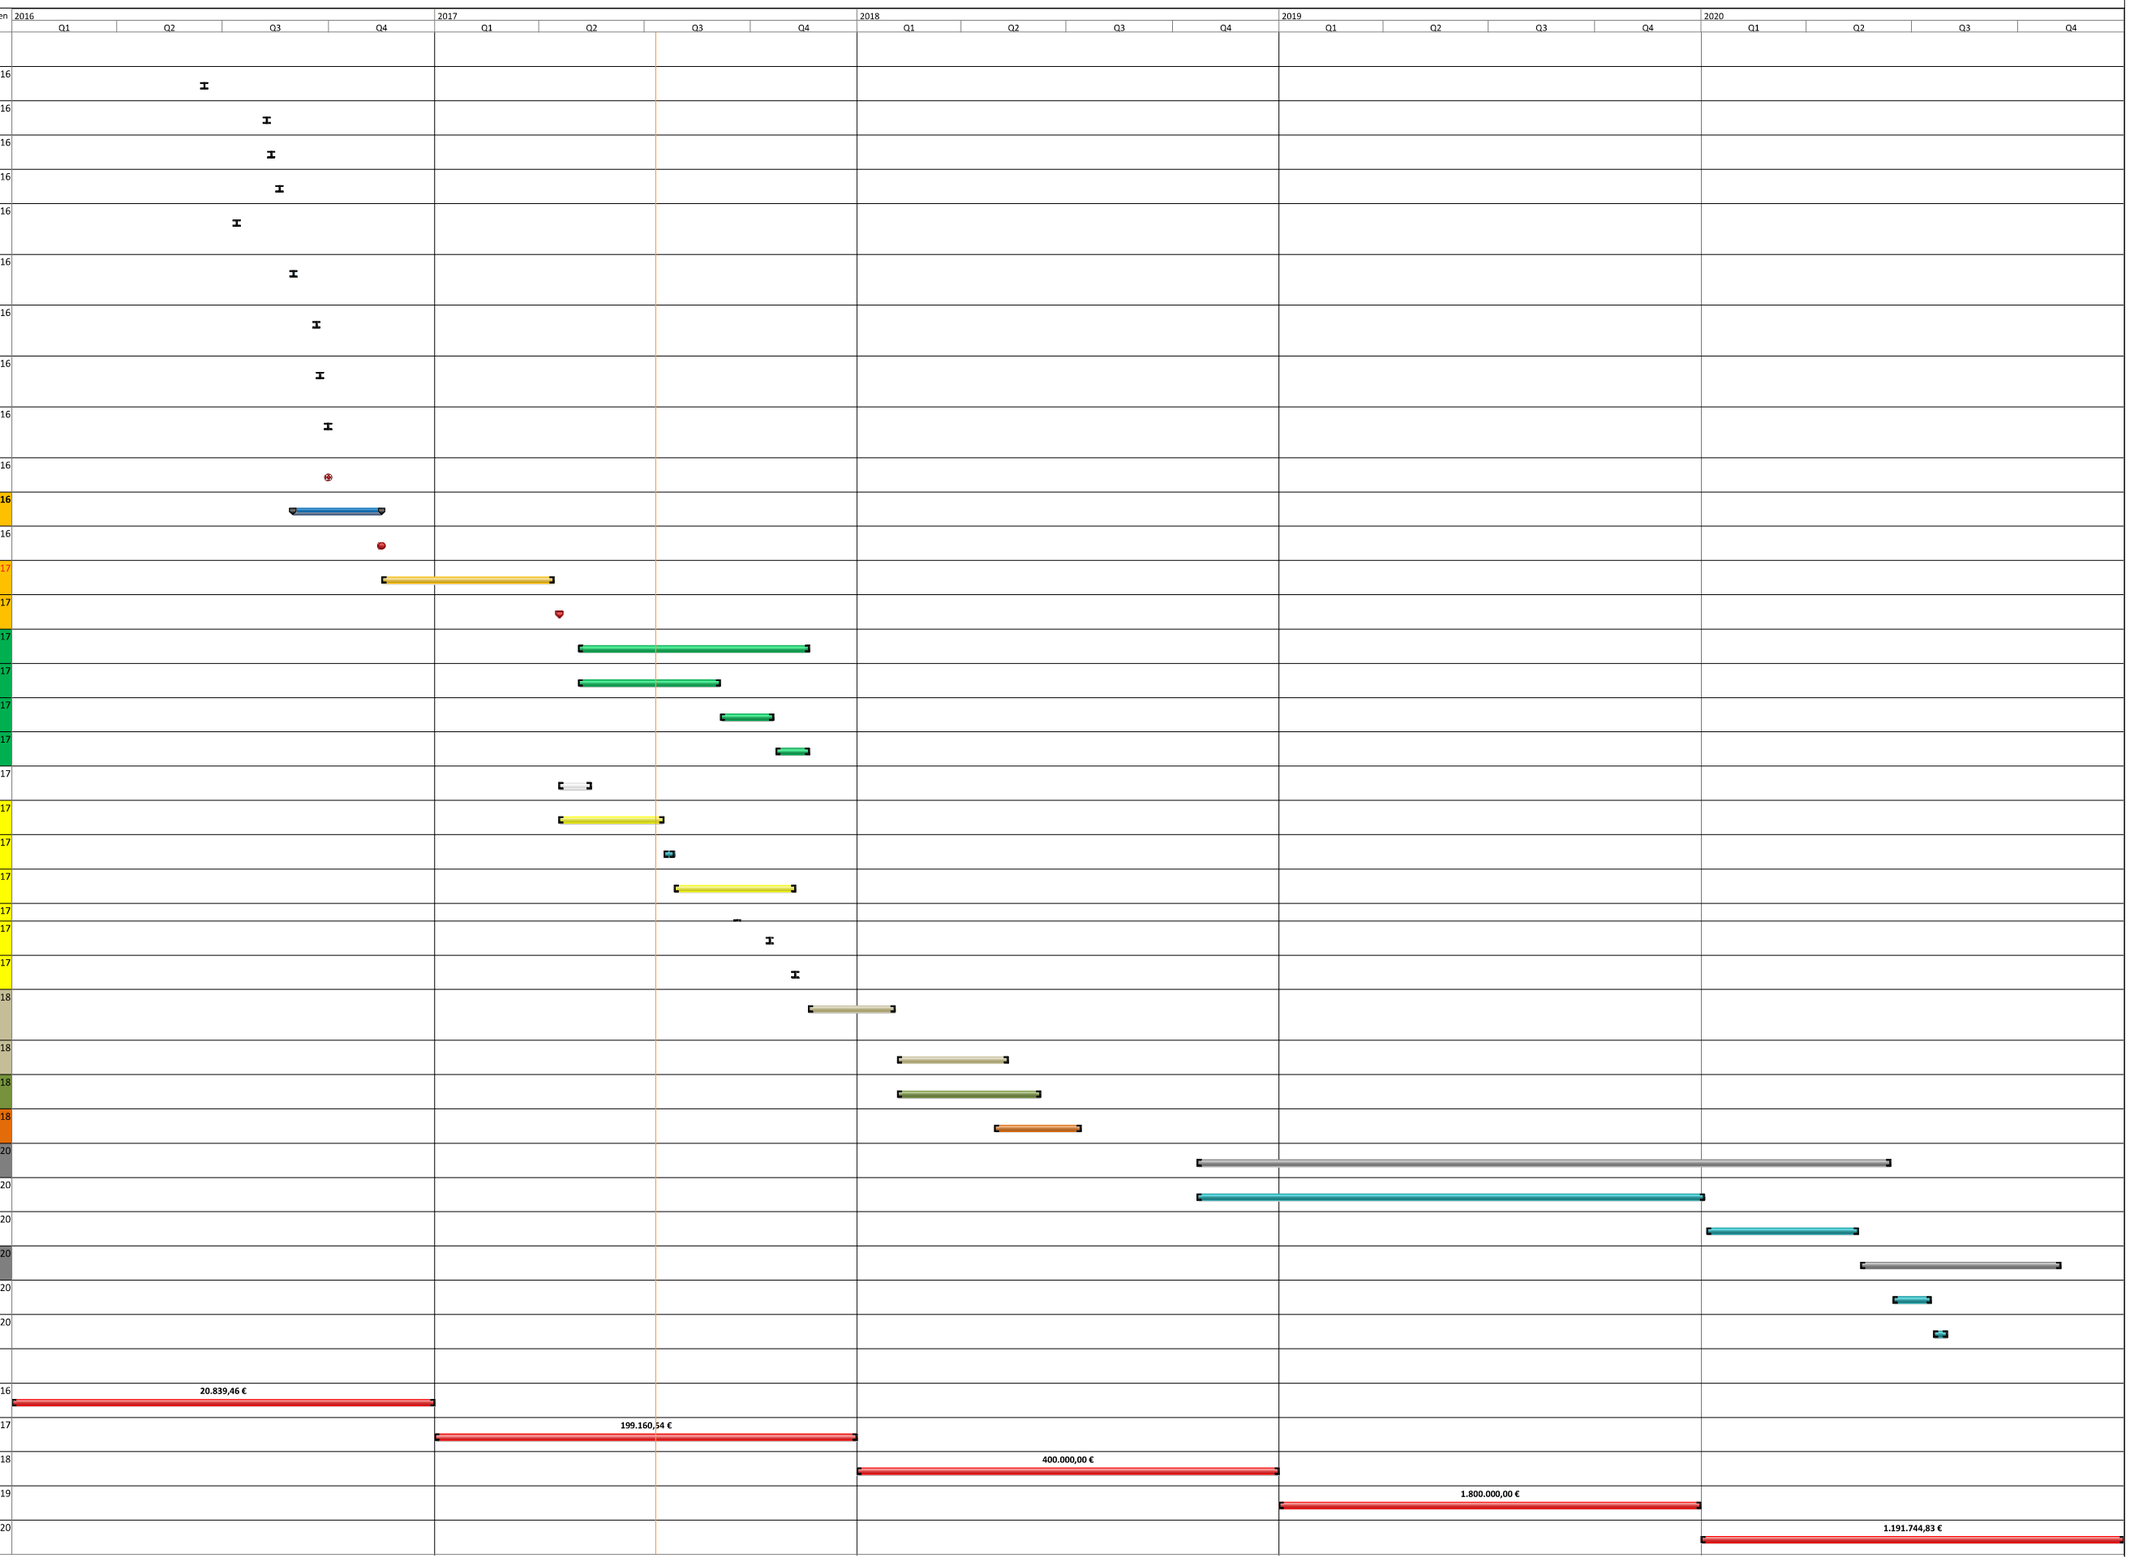

Projekt: Korczak-Schule
Datum: Di 11.07.17

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Stichtag
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | In Arbeit

Planungsstand: 03.07.2017
