Stichtag: 01.02.18 08:00

Nr.	Name	Dauer	Anfang	Ende
1	**KGR 700**	**303**	**02.01.18**	**28.02.19**
1.1	**Planung LPh 2-7**	**140**	**02.01.18**	**16.07.18**
1.1.1	Erstellung Beschlussvorlage/ Ämterdurchlauf	92	15.01.18	22.05.18
1.1.2	Bauausführungsbeschluss	0	23.05.18	23.05.18
1.1.3	Standsicherheitsnachweis, TWPL	20	15.01.18	09.02.18
1.1.4	Ausführungsplanung LPh 5	44	02.01.18	02.03.18
1.1.5	Erstellung LV, LPh 6	20	05.03.18	30.03.18
1.1.6	Prüfung ZVS/ Überarbeitung Vergabeunterlagen	22	27.04.18	29.05.18
1.1.7	Ausschreibefrist Los 1	10	29.05.18	12.06.18
1.1.8	Vergabe LPh 7	24	12.06.18	13.07.18
1.1.9	Auftragserteilung	1	16.07.18	16.07.18
1.2	**KGR 700 Bauüberwachung LPh 8**	**152**	**01.08.18**	**28.02.19**
1.2.1	Bauüberwachung LPh 8	152	01.08.18	28.02.19
2	**Bauausführung KGR 300/ 400/ 500**	**152**	**01.08.18**	**28.02.19**
2.1	Los 1 Rohbau- Bodenplatte, Stahlbau, BE	43	01.08.18	28.09.18
2.2	Los 2 Zimmererarbeiten/ Dachabdichtung	50	17.09.18	23.11.18
2.3	Los 3 Fenster/ Außentüren	5	22.10.18	26.10.18
2.4	Los 4 Stahlbauarbeiten (Deckel)	15	22.10.18	09.11.18
2.5	Los 5 TGA, Heizung	20	29.10.18	23.11.18
2.6	Los 6 ELT	5	05.11.18	09.11.18
2.7	Los 7 Außenanlagen	50	26.11.18	01.02.19
2.8	Abnahmen, Restarbeiten	29	19.11.18	28.02.19
3	**Budget, Kostenberechnung**	**303**	**02.01.18**	**28.02.19**
3.1	340.897,47 € gesamt (Kostenstand v. 22.01.16)	303	02.01.18	28.02.19
3.2	306.808 € (2018) = Ansatz 90%	260	02.01.18	31.12.18
3.3	34.089,47 € (2019) = Ansatz 10%	44	31.12.18	28.02.19

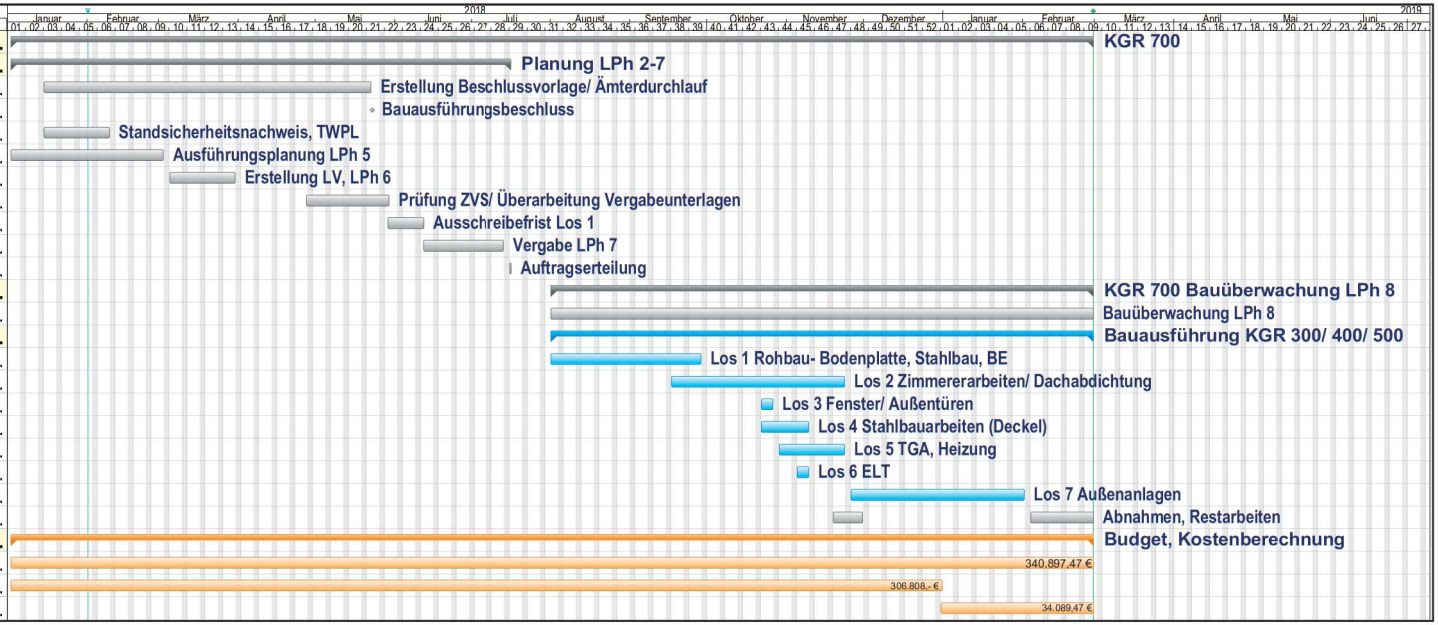

gesamt 340.897,47 €

306.808,- € 2018

34.089,47 € 02/ 2019

Bauzeiten- Kostenplan

Stand: 01.02.2018
